


配置図 SCALE 1:300

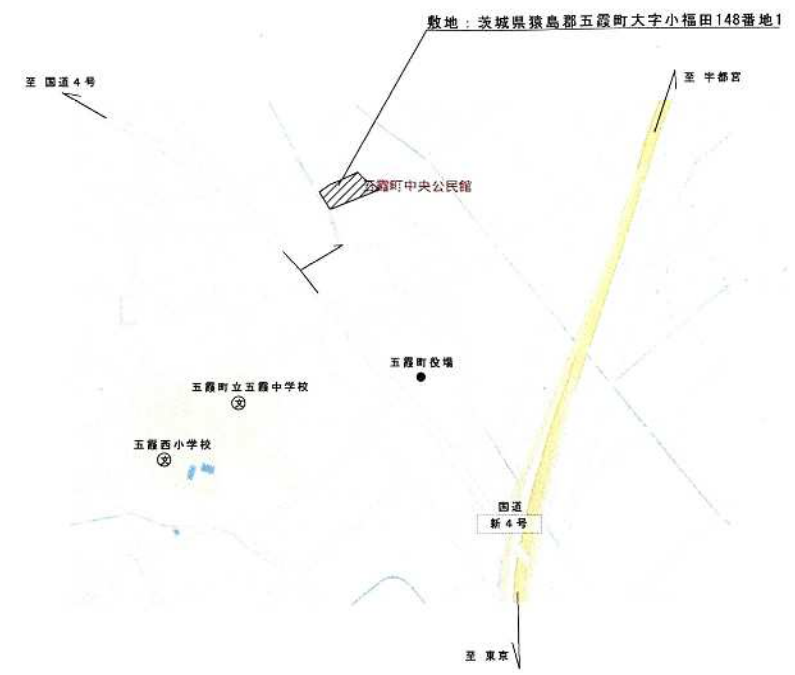

案内図 SCALE FREE

工事概要

- 1: 天井材及び天井裏飛散性アスベスト除去工事
- 2: 屋根面吹付断熱材+新設耐震天井改修工事
- 対象室: 講堂内天井、五間天井、2階屋外天井

凡例

	工事対象建物
	仮囲い ベニヤ板 H=1,800
	シート W6,000×H4,500
	養生鉄板 t22
	枠組本足場 建付巾900(手すり先行方式)
	場外集積所 枠組本足場 建付巾600 2段 鋼板取付
	枠組本足場
	石棉粉塵濃度測定(作業前・中・後)

特記事項

- ・仮設物の設置に伴い破損した工作物は施工者が現場復旧を行う。
- ・施工時において発生したアスファルト舗装やタイル舗装、破損部については施工者が現場復旧を行う。
- ・着工前、着工後とも現場調査を行い破損箇所の管理等を行う。
- ・施工者は施設利用者と工事車両等が接触しない様に明確な工事エリア区分けを行う。
- ・アスベスト除去工事における石棉表示及び濃度測定等は「建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省・建設省・環境省」に基づき行う。
- ・石棉除去材内部一時集積所はビニルシートにて覆い、必ず蓋できる状態にする。
